Urban Mediaspace Aarhus

Rådgivning om indretning og bistand ved udbud af inventar, AV-udstyr og belysning i Dokk1

Hovedtidsplan
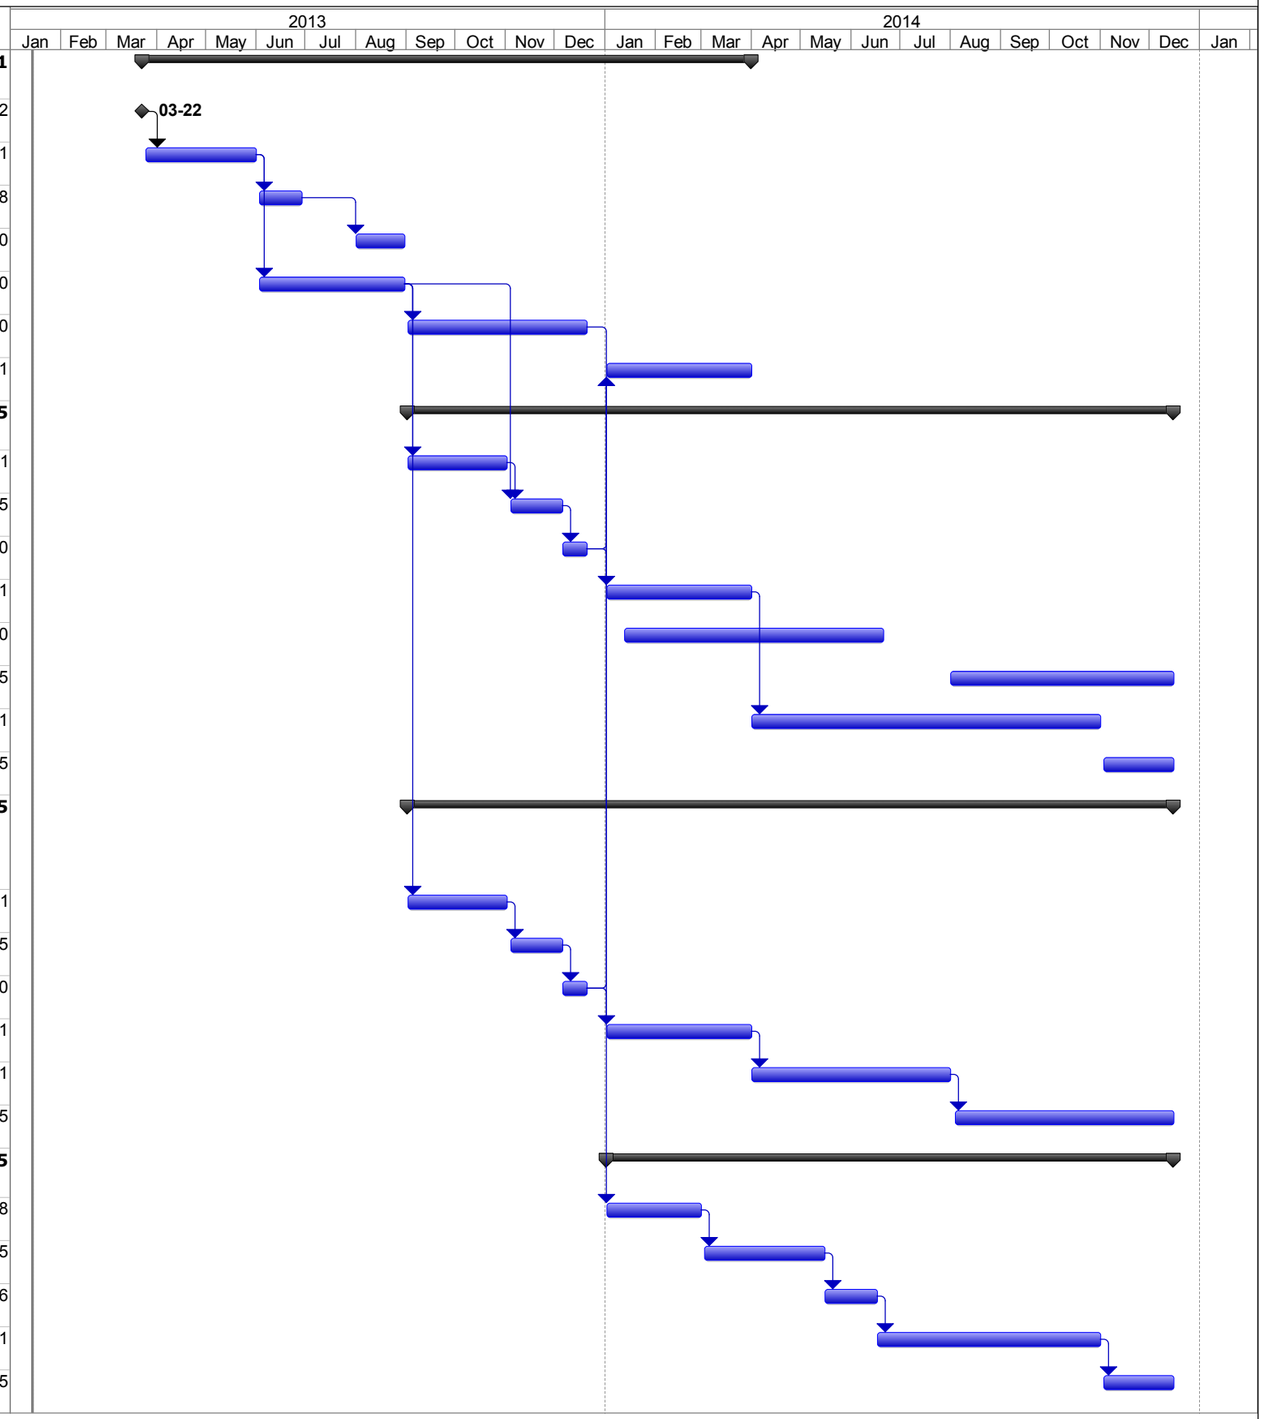
ID	Task Name	Start	Finish
1	**Udviklingsforløb fase 1 og 2**	**Fri 13-03-22**	**Mon 14-03-31**
2	0.1 Kontraktindgåelse med indretningskonsulent	Fri 13-03-22	Fri 13-03-22
3	0.2 Overordnet indretningsplan og økonomisk overslag I	Mon 13-03-25	Fri 13-05-31
4	0.3 Tilrettet overordnet indretningsplan og økonomisk overslag II	Mon 13-06-03	Fri 13-06-28
5	0.4 Konkrete indretningsforslag	Thu 13-08-01	Fri 13-08-30
6	0.5 Udbudsmateriale og prækval., udbudspakke 1 og 2	Mon 13-06-03	Fri 13-08-30
7	0.6 Udbudsmateriale og prækval., udbudspakke 3 (løsøre)	Mon 13-09-02	Fri 13-12-20
8	0.7 Fagspecifikt udviklingsforløb, udbudspakke 1 og 2	Thu 14-01-02	Mon 14-03-31
9	**UP 1. AV -udstyr mv. - indkøb og installering**	**Mon 13-09-02**	**Mon 14-12-15**
10	1.1 Tilbudsperiode	Mon 13-09-02	Fri 13-11-01
11	1.2 Tilbudsevaluering	Mon 13-11-04	Thu 13-12-05
12	1.3 Stand-still periode og kontraktindgåelse	Fri 13-12-06	Fri 13-12-20
13	1.4 Fagspecifikt udviklingsforløb, leverandørprojektering	Thu 14-01-02	Mon 14-03-31
14	1.5 Montage over loft	Mon 14-01-13	Fri 14-06-20
15	1.6 Montage under loft - kabler og ikke letdemontérbart udstyr	Fri 14-08-01	Mon 14-12-15
16	1.7 Bestillingsperiode, udstyr	Tue 14-04-01	Fri 14-10-31
17	1.8 Levering og montage af letdemontérbart udstyr samt indkøring	Mon 14-11-03	Mon 14-12-15
18	**UP 2. Fast inventar, specialmøbler og belysning i sale - indkøb og installering**	**Mon 13-09-02**	**Mon 14-12-15**
19	2.1 Tilbudsperiode	Mon 13-09-02	Fri 13-11-01
20	2.2 Tilbudsevaluering	Mon 13-11-04	Thu 13-12-05
21	2.3 Stand-still periode og kontraktindgåelse	Fri 13-12-06	Fri 13-12-20
22	2.4 Fagspecifikt udviklingsforløb, leverandørprojektering	Thu 14-01-02	Mon 14-03-31
23	2.5 Værkstedsarbejder	Tue 14-04-01	Thu 14-07-31
24	2.6 Levering og montage i bygningen	Mon 14-08-04	Mon 14-12-15
25	**UP 3. Løst inventar og belysning - indkøb og installering**	**Thu 14-01-02**	**Mon 14-12-15**
26	3.1 Tilbudsperiode	Thu 14-01-02	Fri 14-02-28
27	3.2 Tilbudsevaluering	Mon 14-03-03	Thu 14-05-15
28	3.3 Stand-still periode og kontraktindgåelse	Fri 14-05-16	Mon 14-06-16
29	3.4 Bestillingsperiode	Tue 14-06-17	Fri 14-10-31
30	3.5 Levering og montage i bygningen	Mon 14-11-03	Mon 14-12-15
